

SISTEN

Apontamentos de Produção

Manual do usuário — apontamento por tramo, avanço e indicadores



Para quem: líderes e apontadores da produção, Planejamento, Qualidade e administradores do módulo.

Onde fica: menu Produção > Apontamentos de Produção.

Versão de 07/10/2026. As telas deste manual mostram os dados reais do projeto Jacobina (SP01) na carga da planilha "PROD — Avanço de Produção 07-10-26".

Conteúdo

1. O que mudou em relação à planilha
2. Conceitos: marcos, etapas e situação
3. A tela Apontar
4. Avançar um tramo de etapa
5. Atualizar a situação
6. Lançar reparos de solda
7. Apontar vários tramos de uma vez
8. Corrigir ou excluir um lançamento
9. Buscar, filtrar, ver como planilha e exportar
10. No celular e sem internet
11. Avanço: metas, ritmo e curva S
12. Gargalos: tempo entre etapas
13. Qualidade: reparos e retrabalhos
14. Por nave (modelo por etapa)
15. Programação: metas e prazos (Planejamento)
16. Cadastros: situações e carga da planilha
17. Mensagens do sistema e o que fazer
18. Perguntas frequentes

1. O que mudou em relação à planilha

A planilha "PROD — Avanço de Produção" deixa de ser preenchida. Tudo o que ela registrava (aba TRAMOS) e calculava (resumo mensal, acompanhamento semanal do Jato, colunas de "Dias") agora está no SISTEN:

Na planilha	No SISTEN
Digitar a data na coluna "Liberado P/ Jato", "Liberado P/ Pátio"...	Tocar no tramo e no botão do próximo marco (aba Apontar).
Colunas "Setor" e "Atividade" em texto livre	Situação escolhida numa lista da etapa, com data.
"Reparo de Solda" (um total por linha)	Cada reparo é um lançamento datado; o total é somado.
Resumo mensal Plan × Real, ritmo por dia	Aba Avanço , com previsão de término.
Gráficos semanal e acumulado do Jato	Curva S para qualquer marco, com projeção.
Colunas "Dias", "Dias em Processo", "Início × Fim"	Aba Gargalos (mediana, P80 e tramos parados agora).

Cada lançamento tem dono e código.

Todo apontamento recebe um código **APT-DDMMYY-NN**, guarda quem lançou e quando, e nunca é apagado: correções ficam registradas na linha do tempo do tramo.

2. Conceitos: marcos, etapas e situação

Cada tramo (identificado pela **série**, ex.: 3171) percorre sempre a mesma trilha de **5 marcos** — as mesmas datas da planilha:

Marco (data)	Leva o tramo para a etapa	Indicador no Avanço
Início	NAV01 calandra e visual	—
Liberado p/ NAV02	NAV02 SAW02/03 e Internos	NAV01
Liberado p/ Jato	Jato / White jato, pintura e montagem	Jato (Black)
Liberado p/ Pátio	Pátio Greentag, aguardando expedição	Greentag
Expedido	Expedido enviado ao parque	Expedido

Antes do Início o tramo fica em **A iniciar** (corte e chapas). As cores seguem o padrão de cores da fábrica.

Regras que o sistema aplica

- Os marcos seguem a ordem: não dá para liberar para o Pátio um tramo que não foi liberado para o Jato.
- A data de um marco não pode ser antes do marco anterior nem depois do seguinte.
- Não se lança data futura. Data com **mais de 7 dias** exige uma observação (evita erro de digitação).
- Cada marco é lançado uma vez por tramo. Para mudar a data, use **Corrigir** (capítulo 8).

Situação

Dentro de cada etapa, a **situação** diz onde o tramo está agora — é o antigo "Setor + Atividade" da planilha, por exemplo *Internos · Laudo UT*, *Montagem · Montagem em Andamento* ou *Pátio · Liberado p/ Pátio (Retrabalho Flange)*. A situação tem data, então o sistema também sabe há quanto tempo o tramo está naquele setor. A lista de situações é mantida em Cadastros (capítulo 16).

O que conta como "NAV01" nos indicadores

O NAV01 concluído é a data de **Liberado p/ NAV02**. Por isso o SISTEN mostra **80** e não 88 como na planilha: lá, junho e julho estavam digitados como 25 (iguais à meta), mas as datas reais somam 12 e 14.

3. A tela Apontar

É a aba que abre primeiro. Cada coluna é uma etapa, com a quantidade de tramos no título. Cada cartão mostra:

- **Série** em destaque, tipo (T1–T5) e torre;
- a **situação** atual (ex.: Laudo UT);
- os **dias na etapa** — o selo à direita: cinza = normal, **âmbar** acima da mediana histórica daquela etapa, **vermelho** acima do P80 (mais lento que 8 em cada 10 tramos que já passaram por ali);
- o ícone de chave com o número de **reparos de solda**, quando houver.

Os tramos mais parados ficam no topo de cada coluna. A coluna Expedido começa recolhida (botão **Mostrar**).

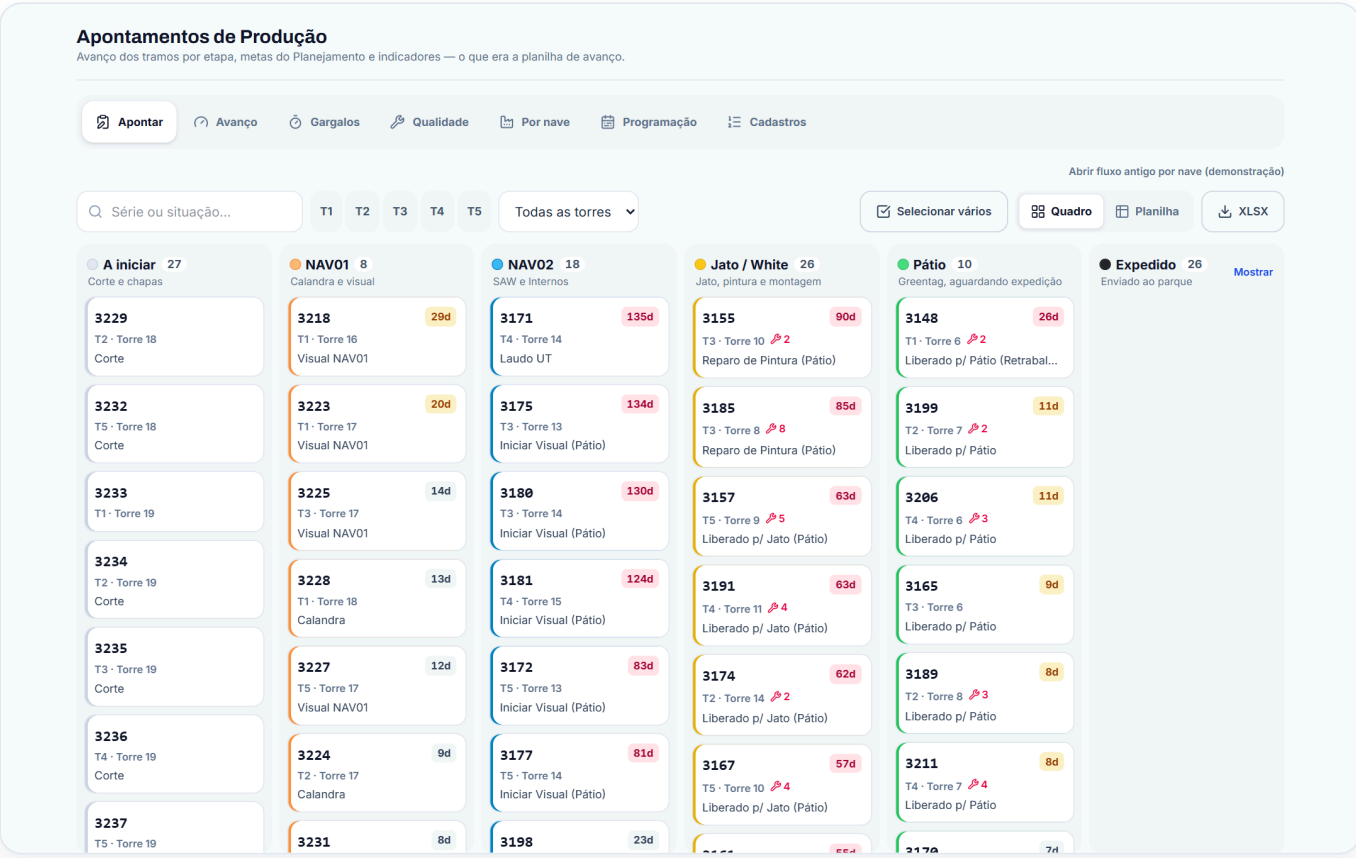


Figura 1 — Quadro por etapa (aba Apontar).

4. Avançar um tramo de etapa

Exemplo: o tramo 3171 terminou o Laudo UT e foi liberado para o Jato.

- 1 Na coluna **NAV02**, toque no cartão **3171**. Abre a janela do tramo, já na aba **Liberado p/ Jato** — o próximo marco.
- 2 Confira a data: **Hoje** já vem marcado. Use **Ontem** (na segunda-feira aparece **Sexta**) ou escolha outra data no calendário.
- 3 Opcional: escolha a **situação** com que o tramo entra na nova etapa (vem marcada a primeira, ex.: *Liberado p/ Jato (Pátio)*). Toque de novo para desmarcar.
- 4 Opcional: escreva uma observação (obrigatória se a data tiver mais de 7 dias).
- 5 Toque no botão azul **Liberado p/ Jato**. Aparece a confirmação com o código (ex.: APT-071026-11) e o cartão passa para a coluna **Jato / White**.

A interface de avanço de tramo 3171 de NAV02 para Jato / White. O título da janela é "NAV02 3171 · T4 · Torre 14" com um ícone de fechar. Abaixo, há uma barra de progresso com três etapas: "Liberado p/ Jato" (selecionada), "Situação" e "Reparos de solda". O status atual é "NAV02 → Jato / White". A seção "DATA — LIBERADO P/ JATO" contém botões "Hoje" e "Ontem", com a data "07/10/2026" selecionada. A seção "SITUAÇÃO AO ENTRAR EM JATO / WHITE (OPCIONAL)" apresenta várias opções: "JATO Liberado p/ Jato (Pátio)" (selecionada), "JATO Jato em Andamento", "PINTURA Pintura em Andamento", "ACABAMENTO DE PINTURA Reparo de Pintura em Andamento", "ACABAMENTO DE PINTURA Reparo de Pintura (Pátio)", "MONTAGEM Iniciar Montagem" e "MONTAGEM Montagem em Andamento". A seção "OBSERVAÇÃO" contém um campo de texto com o exemplo "Ex.: retrabalho no flange, aguardando ponte rolante...". A seção "LINHA DO TEMPO" mostra uma sequência de eventos: "Início 13/05", "→ NAV02 25/05", "→ Jato", "→ Pátio" e "Expedido". No rodapé, há botões "Fechar" e "Liberado p/ Jato".

Figura 2 — Avançar o tramo 3171 de NAV02 para Jato / White.

O Controle de Entrega é outra tela, com dados próprios.

Ele está no módulo **Planejamento** e é lançado lá. Apontar aqui **não** muda o cilindro do tramo no Controle de Entrega, e vice-versa.

5. Atualizar a situação

Use quando o tramo muda de setor **sem trocar de etapa** — por exemplo, saiu do Laudo UT e foi para Solda de Reparo, ou entrou na Montagem.

- 1 Toque no cartão do tramo e escolha a aba **Situação**.
- 2 Confira a data.
- 3 Toque na situação atual (as opções são as da etapa em que o tramo está).
- 4 Toque em **Registrar**.

NAV02 3171 · T4 · Torre 14
Internos · Laudo UT — 135 dia(s) na etapa

Liberado p/ Jato Situação Reparos de solda

DATA
Hoje Ontem
07/10/2026

ONDE O TRAMO ESTÁ AGORA

SAW02 SAW02 SAW03 SAW03 INTERNOS Laudo UT INTERNOS Solda de Reparo INTERNOS Iniciar Visual
INTERNOS Visual em Andamento INTERNOS Iniciar Visual (Pátio) INTERNOS Easy Laser

OBSERVAÇÃO
Ex.: retrabalho no flange, aguardando ponte rolante...

LINHA DO TEMPO

Início 13/05	→ NAV02 25/05 12 d	→ Jato —	→ Pátio —	Expedido —
-----------------	--------------------------	-------------	--------------	---------------

25/05/26 — Internos · Laudo UT
APT-250526-03 · ANDRÉ MURITIBA ARAÚJO · importado da planilha

Fechar Registrar

Figura 3 — Situações da etapa NAV02.

6. Lançar reparos de solda

- 1 Toque no cartão e escolha a aba **Reparos de solda**. O rótulo mostra o total atual do tramo.
- 2 Ajuste a quantidade com e (ou digite). É a quantidade a **somar**, não o total.
- 3 Confira a data, escreva uma observação se quiser (ex.: "trinca na circunferencial 3") e toque em .

NAV02 3171 · T4 · Torre 14
Internos · Laudo UT — 135 dia(s) na etapa

Liberado p/ Jato Situação **Reparos de solda**

DATA

07/10/2026

REPAROS DE SOLDA A SOMAR (TOTAL ATUAL: 0)

OBSERVAÇÃO
Ex.: retrabalho no flange, aguardando ponte rolante...

LINHA DO TEMPO

Início 13/05	→ NAV02 25/05 12 d	→ Jato —	→ Pátio —	Expedido —
-----------------	--------------------------	-------------	--------------	---------------

25/05/26 — Internos · Laudo UT
APT-250526-03 · ANDRÉ MURITIBA ARAÚJO · importado da planilha [Corrigir](#)

25/05/26 — Liberado p/ NAV02
APT-250526-02 · ANDRÉ MURITIBA ARAÚJO · importado da planilha [Corrigir](#)

Figura 4 — Somar reparos de solda.

Errou a quantidade?

Não lance um número negativo: corrija o lançamento na linha do tempo (capítulo 8).

7. Apontar vários tramos de uma vez

Quando vários tramos da **mesma etapa** avançam no mesmo dia (ex.: três tramos liberados para o Pátio):

- 1 Toque em **Selecionar vários**. Os cartões ganham uma caixa de marcação.
- 2 Toque nos tramos. Se tocar num tramo de outra etapa, a seleção recomeça nele (o lote é sempre de uma etapa só).
- 3 Na barra escura que aparece embaixo, toque no botão do marco (ex.: **Liberado p/ Pátio**).
- 4 Confira data e situação e confirme. O botão mostra quantos tramos serão lançados, ex.: **Liberado p/ Pátio (3)**.

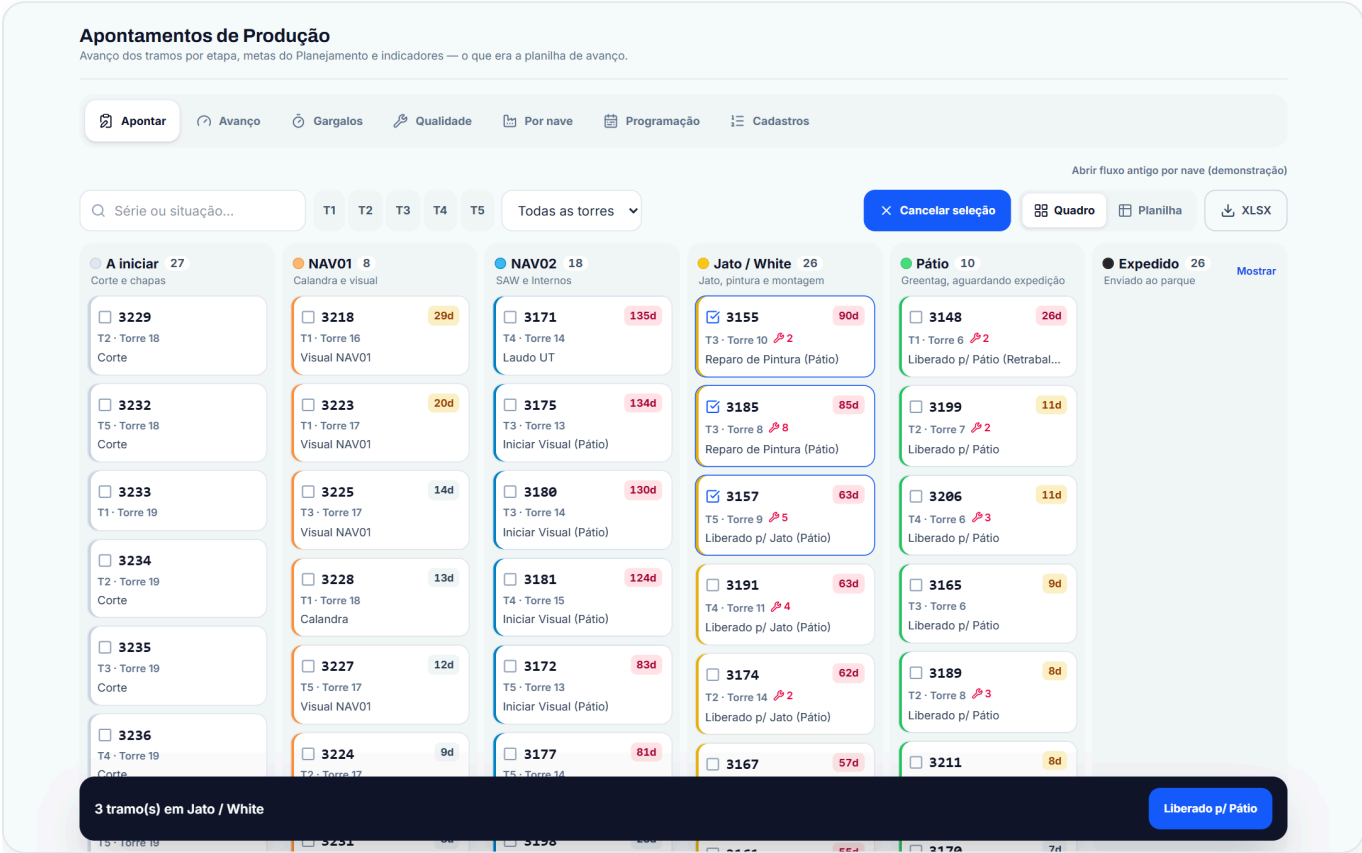


Figura 5 — Três tramos selecionados na coluna Jato / White.

Jato / White

3 tramos — Jato / White

3155, 3157, 3185

×

Liberado p/ Pátio

Situação

Reparos de solda

Jato / White

→

Pátio

DATA — LIBERADO P/ PÁTIO

Hoje

Ontem

07/10/2026

📅

SITUAÇÃO AO ENTRAR EM PÁTIO (OPCIONAL)

PÁTIO

Liberado p/ Pátio

PÁTIO

Liberado p/ Pátio (Retrabalho Flange)

OBSERVAÇÃO

Ex.: retrabalho no flange, aguardando ponte rolante...

✍

Fechar

📄

Liberado p/ Pátio (3)

Figura 6 — Confirmação do lote.

Tudo ou nada.

Se um dos tramos não puder avançar (ex.: data antes do marco anterior), o sistema avisa qual e nada é gravado.

8. Corrigir ou excluir um lançamento

Abaixo do formulário do tramo fica a **linha do tempo**: as 5 datas com os dias entre elas e a lista de todos os lançamentos, com código, autor e origem ("importado da planilha" para o histórico até 07/10/2026).

- 1 Abra o tramo e role até a **Linha do tempo**.
- 2 No lançamento errado, toque em **Corrigir**.
- 3 Ajuste a data (ou a situação / a quantidade de reparos) e escreva o **motivo** — obrigatório.
- 4 Toque em **Salvar correção**, ou em **Excluir** se o lançamento não deveria existir.

NAV02 3171 · T4 · Torre 14

Internos · Laudo UT — 135 dia(s) na etapa

OBSERVAÇÃO

Ex.: retrabalho no flange, aguardando ponte rolante...

LINHA DO TEMPO

Início13/05

→ NAV0225/0512 d

→ Jato—

→ Pátio—

Expedido—

25/05/26 — Internos · Laudo UT

APT-250526-03 · ANDRÉ MURITIBA ARAÚJO · importado da planilha

DATA

25/05/2026

SITUAÇÃO

Internos · Laudo UT

MOTIVO (OBRIGATÓRIO)

Ex.: data digitada errada

Cancelar

Excluir

Salvar correção

25/05/26 — Liberado p/ NAV02

APT-250526-02 · ANDRÉ MURITIBA ARAÚJO · importado da planilha

Corrigir

13/05/26 — Início

APT-130526-02 · ANDRÉ MURITIBA ARAÚJO · importado da planilha

Corrigir

Fechar

Liberado p/ Jato

Figura 7 — Correção na linha do tempo.

Regra	Por quê
Só quem lançou ou um administrador corrige.	Mesma regra dos demais formulários do SISTEN.
Nada é apagado: o lançamento antigo fica riscado, com o motivo.	Auditoria. Use "Mostrar lançamentos corrigidos" para ver.
Para excluir um marco do meio, exclua antes o seguinte.	A trilha de marcos não pode ficar com buraco.

9. Buscar, filtrar, ver como planilha e exportar

- **Busca:** digite a série (ex.: 3152) ou parte da situação (ex.: "Laudo") — o quadro mostra só o que bate.
- **T1... T5:** filtra por tipo de tramo (pode marcar mais de um).
- **Torre:** mostra só os tramos de uma torre.

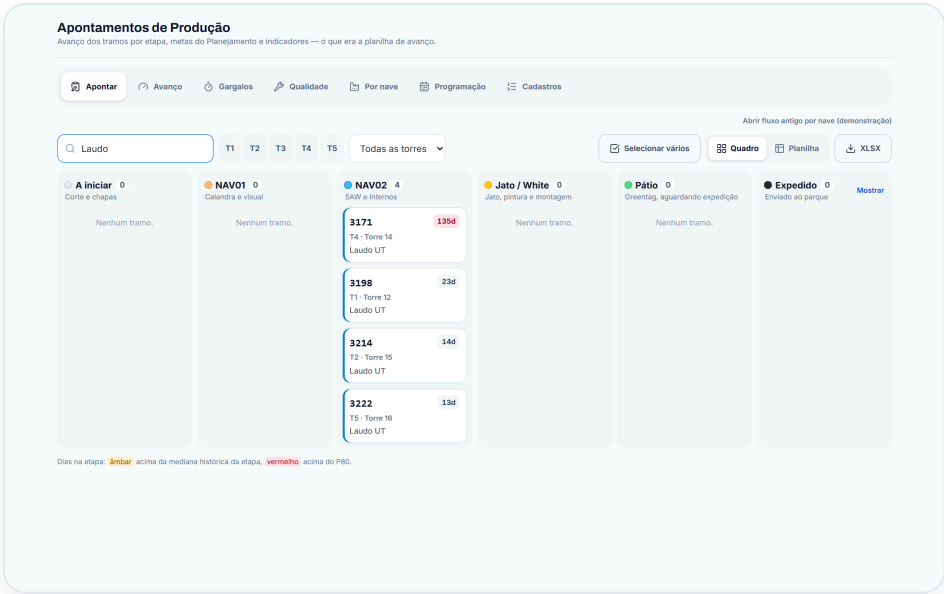


Figura 8 — Busca por "Laudo": só os tramos em Laudo UT.

O botão **Planilha** mostra os tramos no layout da antiga aba TRAMOS — com Semana, Dias, Dias em Processo e Início x Fim calculados. Clicar numa linha abre o mesmo apontamento. O botão **XLSX** baixa esse layout em Excel, para quem ainda precisa da planilha (cliente, relatórios).

Apontamentos de Produção

Avanço dos tramos por etapa, metas do Planejamento e Indicadores — o que era a planilha de avanço.

Apontar

Avanço

Gargalos

Qualidade

Por nave

Programação

Cadastros

Abrir fluxo antigo por nave (demonstração)

Selecionar vários

Quadro

Planilha

XLSX

Q. Laudo

T1

T2

T3

T4

T5

Todas as torres

ITEM	SETOR	TRAMO	SEQ.	ATIVIDADE	REPARO	INÍCIO	NAV02	SEM.	JATO	SEM.	DIAS	PÁTIO	SEM.	DIAS	EM PROC.	EXPEDIDO	SEM.	DIAS	
1	● Expedido	T4	3146	Expedido	26	22/04	01/05	M18	11/06	M24	41	13/08	M33	63	104	27/08	M35	34	1
2	● Expedido	T5	3147	Expedido	2	04/05	28/05	M22	10/07	M28	43	18/08	M34	39	82	28/08	M25	10	1
3	● Expedido	T2	3144	Expedido	2	26/05	03/06	M23	17/07	M29	44	29/08	M35	43	87	01/09	M36	3	9
4	● Expedido	T3	3145	Expedido	7	23/04	04/05	M19	18/06	M25	45	24/08	M35	67	112	02/09	M36	9	1
5	● Expedido	T1	3143	Expedido	1	22/04	18/06	M25	07/08	M32	50	05/09	M36	29	79	05/09	M36	0	1
6	● Expedido	T4	3156	Expedido	11	30/04	14/05	M20	01/07	M27	48	25/08	M35	55	103	08/09	M37	14	1
7	● Expedido	T3	3160	Expedido	3	08/05	18/05	M21	12/08	M33	86	26/08	M35	14	100	09/09	M37	14	1
8	● Expedido	T2	3169	Expedido	3	08/06	09/07	M28	05/08	M32	27	24/08	M35	19	46	09/09	M37	16	9
9	● Expedido	T5	3182	Expedido	9	11/06	27/07	M31	18/08	M34	22	09/09	M37	22	44	09/09	M37	0	9
10	● Expedido	T2	3149	Expedido	2	29/05	09/06	M24	21/07	M30	42	12/08	M33	22	64	14/09	M38	33	1
11	● Expedido	T4	3151	Expedido	10	29/04	06/05	M19	19/06	M25	44	12/08	M33	54	98	14/09	M38	33	1
12	● Expedido	T5	3192	Expedido	5	18/06	14/08	M33	01/09	M36	18	11/09	M37	19	28	14/09	M38	3	8
13	● Expedido	T3	3195	Expedido	4	30/06	11/08	M33	26/08	M35	15	11/09	M37	16	31	14/09	M38	3	7
14	● Expedido	T3	3150	Expedido	8	29/04	09/05	M19	26/06	M26	48	17/08	M34	52	100	18/09	M38	32	1
15	● Expedido	T4	3186	Expedido	5	22/05	10/06	M24	22/07	M30	42	18/09	M38	58	100	18/09	M38	0	1
16	● Expedido	T5	3187	Expedido	7	17/06	04/08	M32	22/08	M34	18	17/09	M38	26	44	18/09	M38	1	9
17	● Expedido	T1	3153	Expedido		04/05	16/07	M29	15/08	M33	30	15/09	M38	31	61	19/09	M38	4	1
18	● Expedido	T1	3158	Expedido	3	12/05	21/07	M30	20/08	M34	30	19/09	M38	30	60	19/09	M38	0	1
19	● Expedido	T2	3194	Expedido	4	20/07	19/08	M34	04/09	M36	16	16/09	M38	12	28	23/09	M39	7	6
20	● Expedido	T5	3152	Expedido	71	21/05	10/06	M24	05/08	M32	56	23/09	M39	49	105	24/09	M39	1	1
21	● Expedido	T4	3176	Expedido	5	16/06	20/06	M23	13/07	M29	43	12/08	M35	74	116	24/09	M39	1	7

Figura 9 — Visão planilha (somente leitura).

10. No celular e sem internet

No celular o quadro mostra **uma etapa por vez**: toque na etapa nos botões coloridos (com a contagem) e depois no tramo. A janela do tramo abre de baixo para cima, com os botões ao alcance do polegar.



Figura 10 — Quadro no celular.



Figura 11 — Apontamento no celular.

Sem sinal no pátio

- 1 Aponte normalmente. Sem rede, o SISTEN avisa: *"apontamento salvo no aparelho; sobe sozinho quando a conexão voltar"*.
- 2 O cartão mostra **"aguardando sincronizar"** e o selo de pendências aparece no canto da tela.
- 3 Quando o sinal voltar, o envio é automático (ou use **Sincronizar agora** no selo).

Se o envio for recusado

(ex.: outro colega já lançou o mesmo marco), a pendência mostra o motivo. Abra o tramo, confira a linha do tempo e corrija se preciso.

11. Avanço: metas, ritmo e curva S

Substitui o resumo mensal e o acompanhamento do Jato da planilha.

Cartões por marco



Figura 12 — Um cartão por indicador.

Linha	Como ler
80/115 70%	Tramos que já passaram pelo marco, do total do projeto.
Saldo	Quanto falta.
Ritmo necessário	Tramos por dia útil para zerar o saldo até o prazo (o "1,04" da planilha).
Ritmo real (4 sem.)	Tramos por dia útil nas últimas 4 semanas.
Previsão de término	Quando o saldo acaba no ritmo real. Vermelho = depois do prazo.

Tabela mensal Plan x Real

Igual à da planilha, com Expedido incluído. **Verde** = bateu a meta; **vermelho** = mês fechado abaixo; **âmbar** = mês corrente ainda abaixo (não fica vermelho antes de o mês acabar).

MÊS	NAV01		Jato (Black)		Greentag		Expedido	
	PLAN	REAL	PLAN	REAL	PLAN	REAL	PLAN	REAL
Mai/26		16		0		0		0
Jun/26	25	12	4	4		0		0
Jul/26	25	14	18	10	1	0		0
Ago/26	25	19	25	26	25	11		2
Set/26	25	16	27	20	25	22		23
Out/26	15	3	25	2	25	3		1
Nov/26			16		25			
Dez/26					14			
TOTAL	115	80	115	62	115	36		26
Saldo		35		53		79		89

Verde = bateu a meta; vermelho = mês fechado abaixo; âmbar = mês corrente ainda abaixo. NAV01 conta a liberação para a NAV02.

Figura 13 — Plan x Real por mês, total e saldo.

Gráficos

Escolha o indicador nos botões **Gráficos de** (NAV01, Jato, Greentag, Expedido).

- **Plan x Real por mês:** barras laranja (plano) e azul (real).
- **Acompanhamento semanal e acumulado (curva S):** barras claras = semana; linha laranja em degraus = plano acumulado; linha azul = real acumulado; **tracejado** = projeção no ritmo das últimas 4 semanas. Quando a linha tracejada fica abaixo da laranja no fim, o marco não fecha no prazo sem aumentar o ritmo.



Figura 14 — Jato: mensal e curva S com projeção.

Meta semanal x mensal.

Hoje só o Jato tem meta semanal (W32–W48). Para os outros marcos, o plano do mês entra de uma vez na semana em que o mês fecha — por isso a linha laranja sobe em degraus.

Grade de torres

Cada coluna é uma torre (1 a 23), com T5 no topo e T1 na base, na cor da etapa de cada tramo. A torre com **contorno verde** está completa no pátio — os 5 tramos prontos — e pode ser expedida. Passe o mouse (ou toque) num tramo para ver série e situação.



Figura 15 — Torre 6 completa no pátio.

12. Gargalos: tempo entre etapas

Transforma as colunas "Dias" da planilha em indicador.

- **Cartões de trecho** (NAV01, NAV02 → Jato, Jato → Pátio, Pátio → Expedido, Dias em processo, Início × Fim): a **mediana** (metade dos tramos leva menos que isso), o **P80** (8 em cada 10 levam até isso) e o máximo. Clique para ver o gráfico.
- **Lead time por mês**: a mediana e o P80 do trecho escolhido por mês de conclusão — mostra se a etapa está ficando mais rápida ou mais lenta.
- **Em processo agora**: quantos tramos estão parados em cada etapa, por faixa de dias. É o que a planilha não mostrava.
- **Mais parados**: os 15 tramos há mais tempo na etapa. Toque para apontar.

Apontamentos de Produção

Avanço dos tramos por etapa, metas do Planejamento e indicadores — o que era a planilha de avanço.


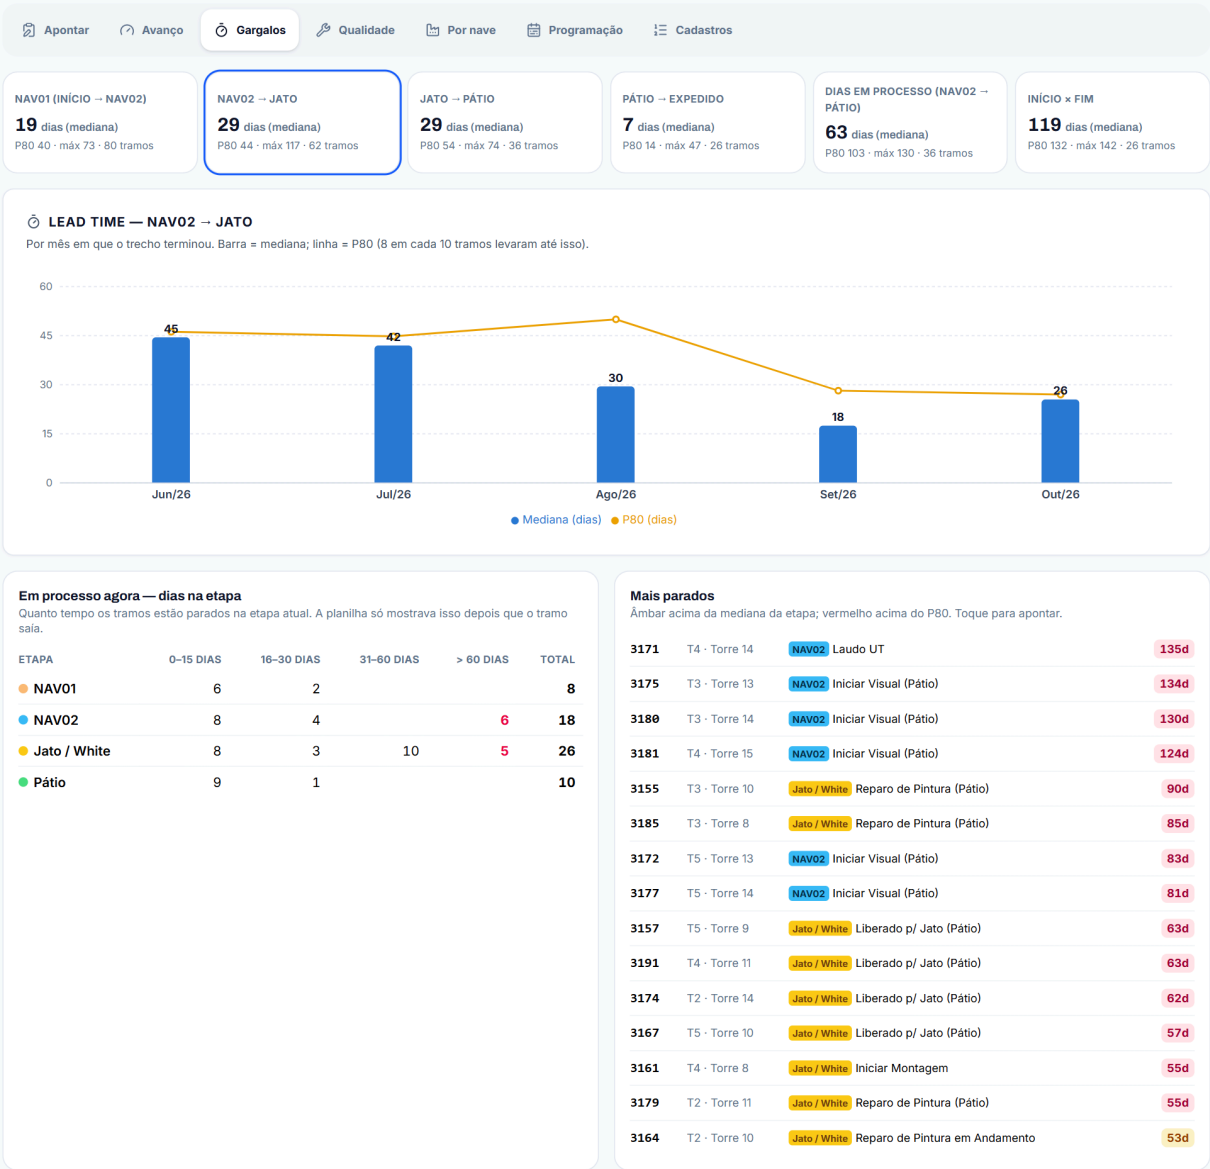


Figura 16 — Gargalos.

13. Qualidade: reparos e retrabalhos

- Total de reparos de solda, quantos tramos tiveram reparo e a média por tramo já liberado para o Jato.
- **Reparos por mês** — os reparos do histórico entram no mês da liberação para o Jato; os novos, na data do lançamento.
- **Por tipo de tramo** — T4 e T5 concentram a maior parte.
- **Tramos com mais reparos** e **Em retrabalho agora** (situação com "reparo" ou "retrabalho"). Toque para abrir o tramo.

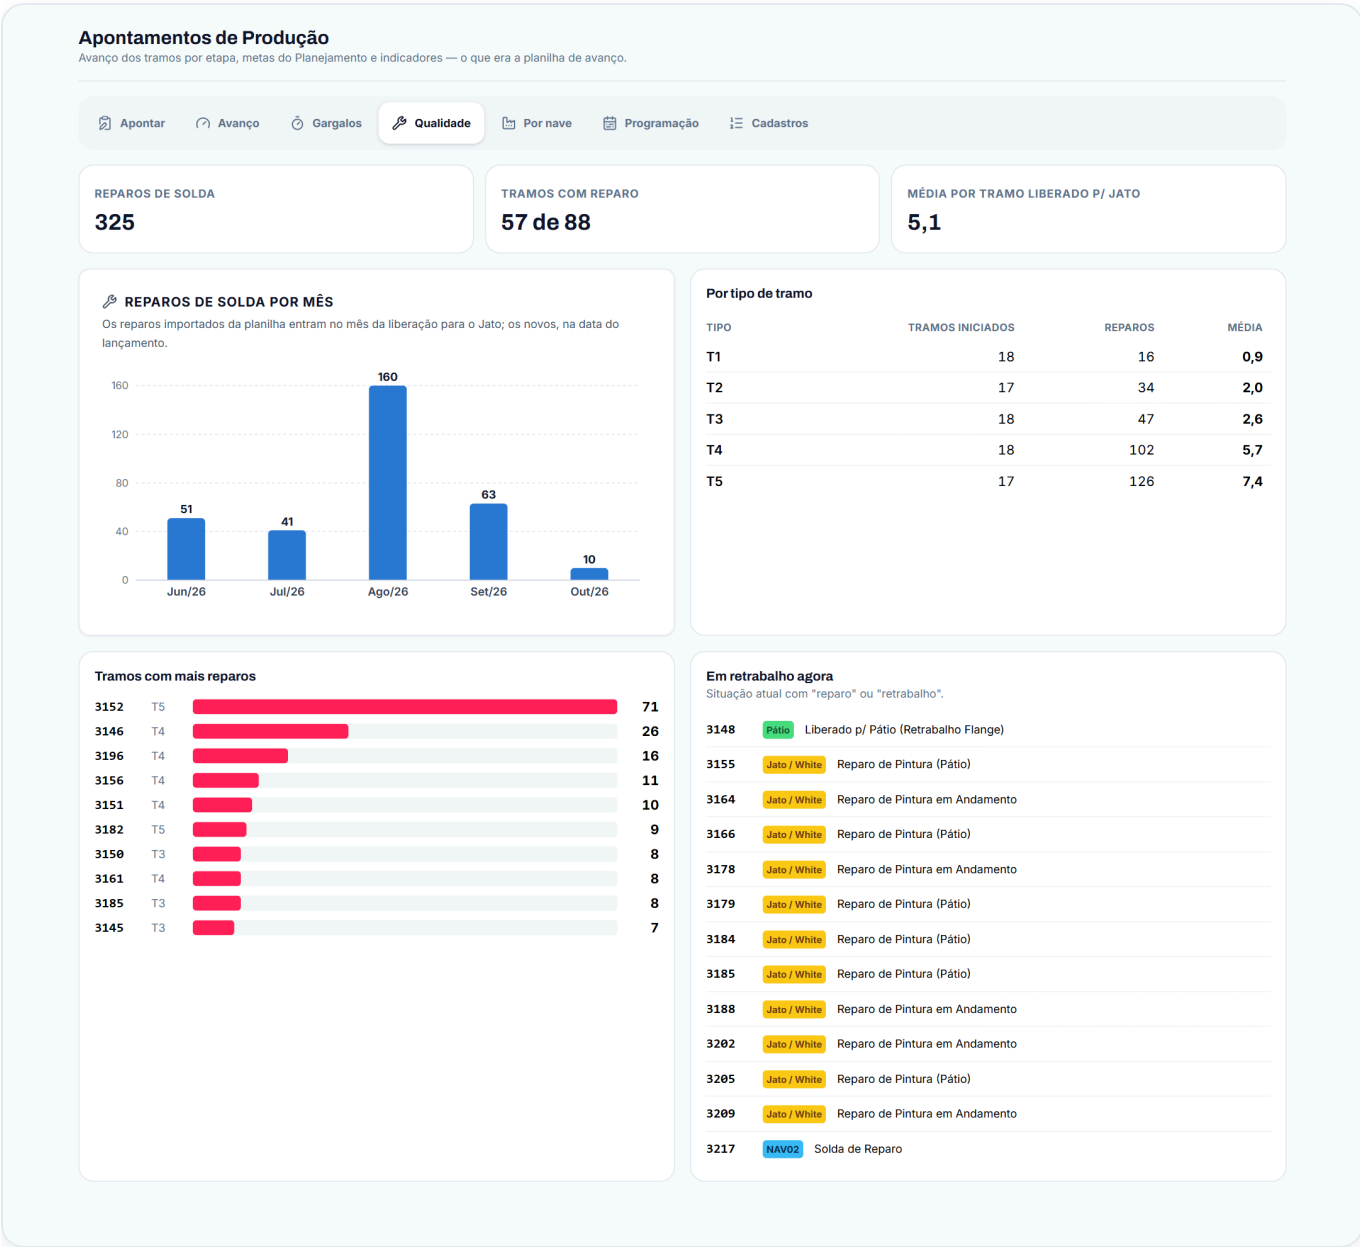

14. Por nave (modelo por etapa)

É a tela que já existia: programado × realizado por etapa das três naves (chapas, virolas, soldas), semana a semana, com os relatórios "Previsto × Realizado". Continua igual — use o seletor de período no canto superior direito.

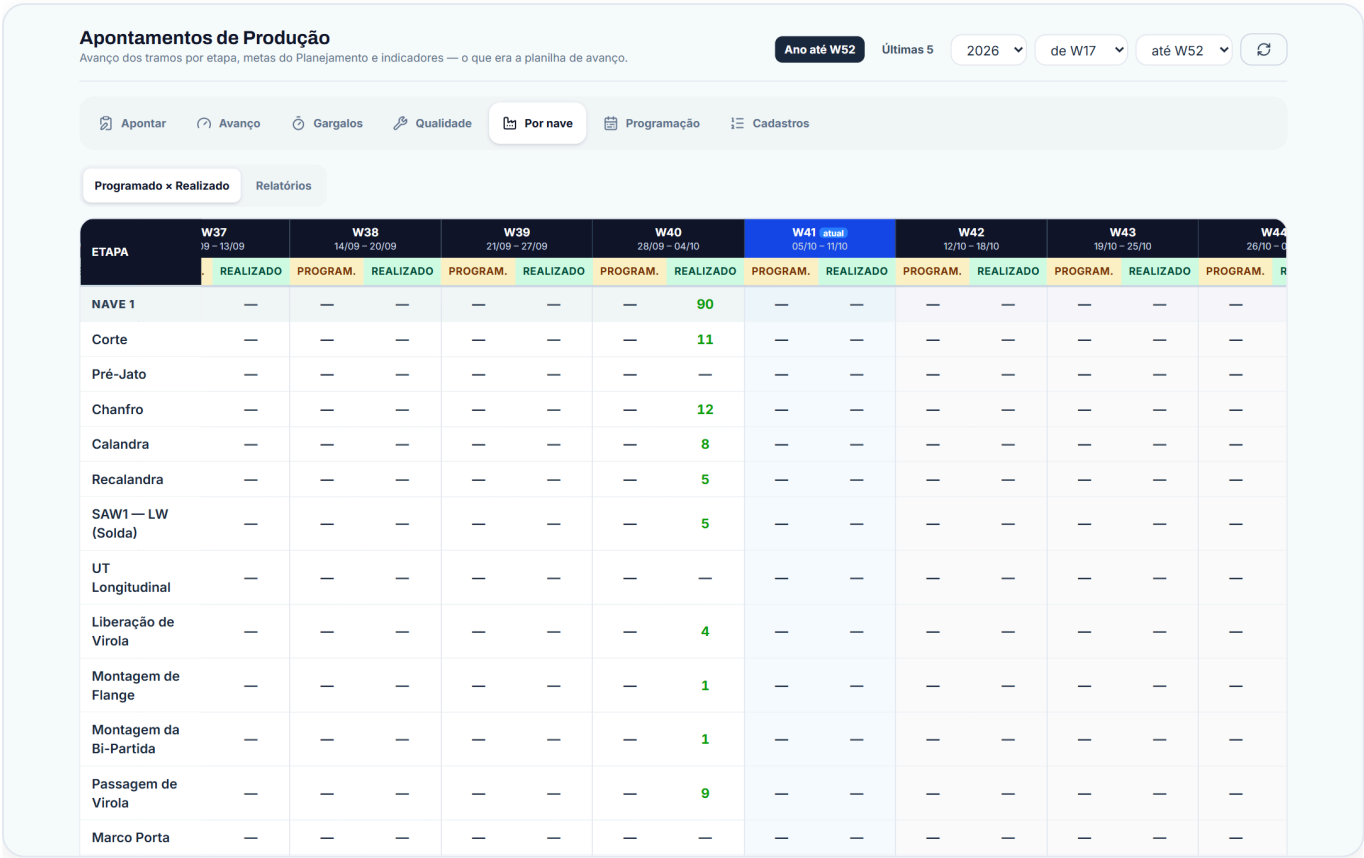


Figura 18 — Programado × Realizado por etapa.

15. Programação: metas e prazos (Planejamento)

Em **Programação > Metas por marco (tramos)**. Só edita quem tem o acesso "Programar apontamentos"; os demais veem em modo leitura.

- 1 Total e prazo por marco:** informe o total (115) e a data final de cada marco. O prazo é a base do ritmo necessário e da cor da previsão no Avanço.
- 2 Meta mensal:** digite a quantidade de cada mês. Deixe vazio para "sem meta". A coluna Total soma o ano.
- 3 Meta semanal (opcional):** escolha o marco e preencha as semanas. A partir da 1ª semana preenchida, a curva S usa a semanal.
- 4** Toque em **Salvar metas** (canto inferior direito).

Total e prazo por marco

O prazo é a base do ritmo necessário (saldo + dias úteis até o prazo).

NAV01 (Liberado p/ NAV02)

TOTAL115

PRAZO31/10/2026

Jato (Black) (Liberado p/ Jato)

TOTAL115

PRAZO30/11/2026

Greentag (Liberado p/ Pátio)

TOTAL115

PRAZO31/12/2026

Expedido (Expedido)

TOTAL115

PRAZOdd/mm/aaaa

Figura 19 — Total e prazo por marco.

Meta mensal

2026

MARCO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
NAV01						25	25	25	25	15			115
Jato (Black)						4	18	25	27	25	16		115
Greentag							1	25	25	25	25	14	115
Expedido													0

Figura 20 — Meta mensal (carregada da planilha).

Meta semanal (opcional)

Jato (Black)

A partir da 1ª semana preenchida, a curva S usa a meta semanal em vez da mensal.

W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W08	W09	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21
W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28	W29	W30	W31	W32	W33	W34	W35	W36	W37	W38	W39	W40	W41	W42
										6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6
W43	W44	W45	W46	W47	W48	W49	W50	W51	W52	W53										
6	6	4	4	4	4															

Soma das semanas: 93

Figura 21 — Meta semanal do Jato: 93 nas semanas + 22 de junho e julho = 115.

Confirme os prazos.

Os prazos iniciais (31/10 para NAV01, 30/11 para Jato e 31/12 para Greentag) foram estimados pelo último mês com meta. Ajuste para as datas contratuais.

SISTEN — Apontamentos de Produção · Manual do usuário

19/23

Importar planilha

Usada uma vez, na migração. Lê as abas TORRE e TRAMOS, confere a matriz torre x tramo, guarda a impressão digital (SHA-256) do arquivo e carrega o histórico. Importar o mesmo arquivo de novo não duplica nada. **A carga de 07/10/2026 já foi feita** — não é preciso repetir.

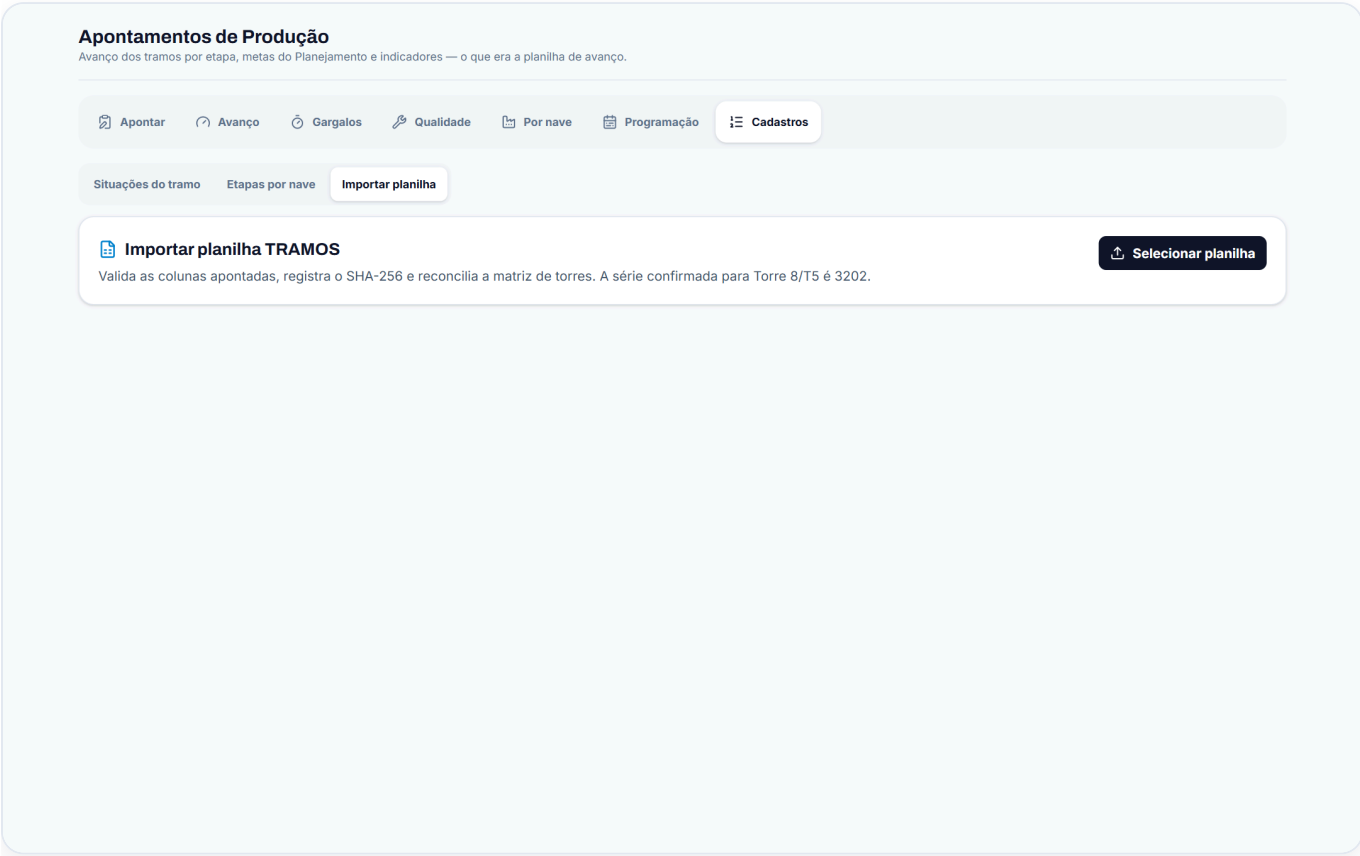


Figura 23 — Importar planilha TRAMOS.

17. Mensagens do sistema e o que fazer

Mensagem	O que fazer
"Liberado p/ Pátio" exige "Liberado p/ Jato" antes.	Lance primeiro o marco anterior (com a data certa) e depois este.
"... (24/05/26) não pode ser antes de ... (25/05/26)."	A data está antes do marco anterior. Confira a data ou corrija o marco anterior.
O tramo já tem o marco "...". Use Corrigir para mudar a data.	O marco já foi lançado (por você ou por um colega). Veja a linha do tempo.
A data não pode ser futura.	Use a data em que aconteceu.
Data com mais de 7 dias exige observação.	Escreva por que está lançando atrasado.
Exclua primeiro o marco seguinte.	Para apagar um marco do meio, exclua antes os posteriores.
Só quem lançou ou um administrador pode corrigir.	Peça ao autor (aparece na linha do tempo) ou a um administrador.
Acesso negado ao apontamento de produção.	Peça ao administrador o acesso à página em Gestão de Acessos.

18. Perguntas frequentes

O apontamento atualiza o Controle de Entrega (cilindros)?

Não. O Controle de Entrega fica no módulo **Planejamento** e, por enquanto, tem lançamento e fonte de dados próprios. Os dois podem mostrar etapas diferentes para o mesmo tramo.

O tramo está na coluna errada.

Abra o tramo e confira a linha do tempo. Se um marco foi lançado por engano, corrija ou exclua com motivo (capítulo 8).

Por que um tramo aparece em vermelho com poucos dias?

A cor compara com o histórico **daquela etapa**. Uma etapa normalmente rápida (ex.: Pátio → Expedido, mediana de 7 dias) fica vermelha antes de uma etapa longa.

A planilha mostrava 88 em NAV01 e o sistema mostra 80.

O SISTEN conta as datas reais de "Liberado p/ NAV02". A diferença está em junho e julho, que na planilha estavam digitados iguais à meta.

Lancei sem internet e o cartão não mudou de coluna.

O cartão só muda quando o servidor confirma. Enquanto isso ele mostra "aguardando sincronizar". Não lance de novo.

Onde ficou a tela antiga de apontamento por nave?

Em Apontar, no link "Abrir fluxo antigo por nave (demonstração)". Ela será desativada depois do período de transição.
